


靖边低空经济产业基地建设项目一期 专项债券续发情况说明

主管部门：靖边县发展和改革委员会

财政部门：靖边县财政局

实施单位：靖边县智能无人系统和通航产业科创中心

编制时间：二〇二六年六月

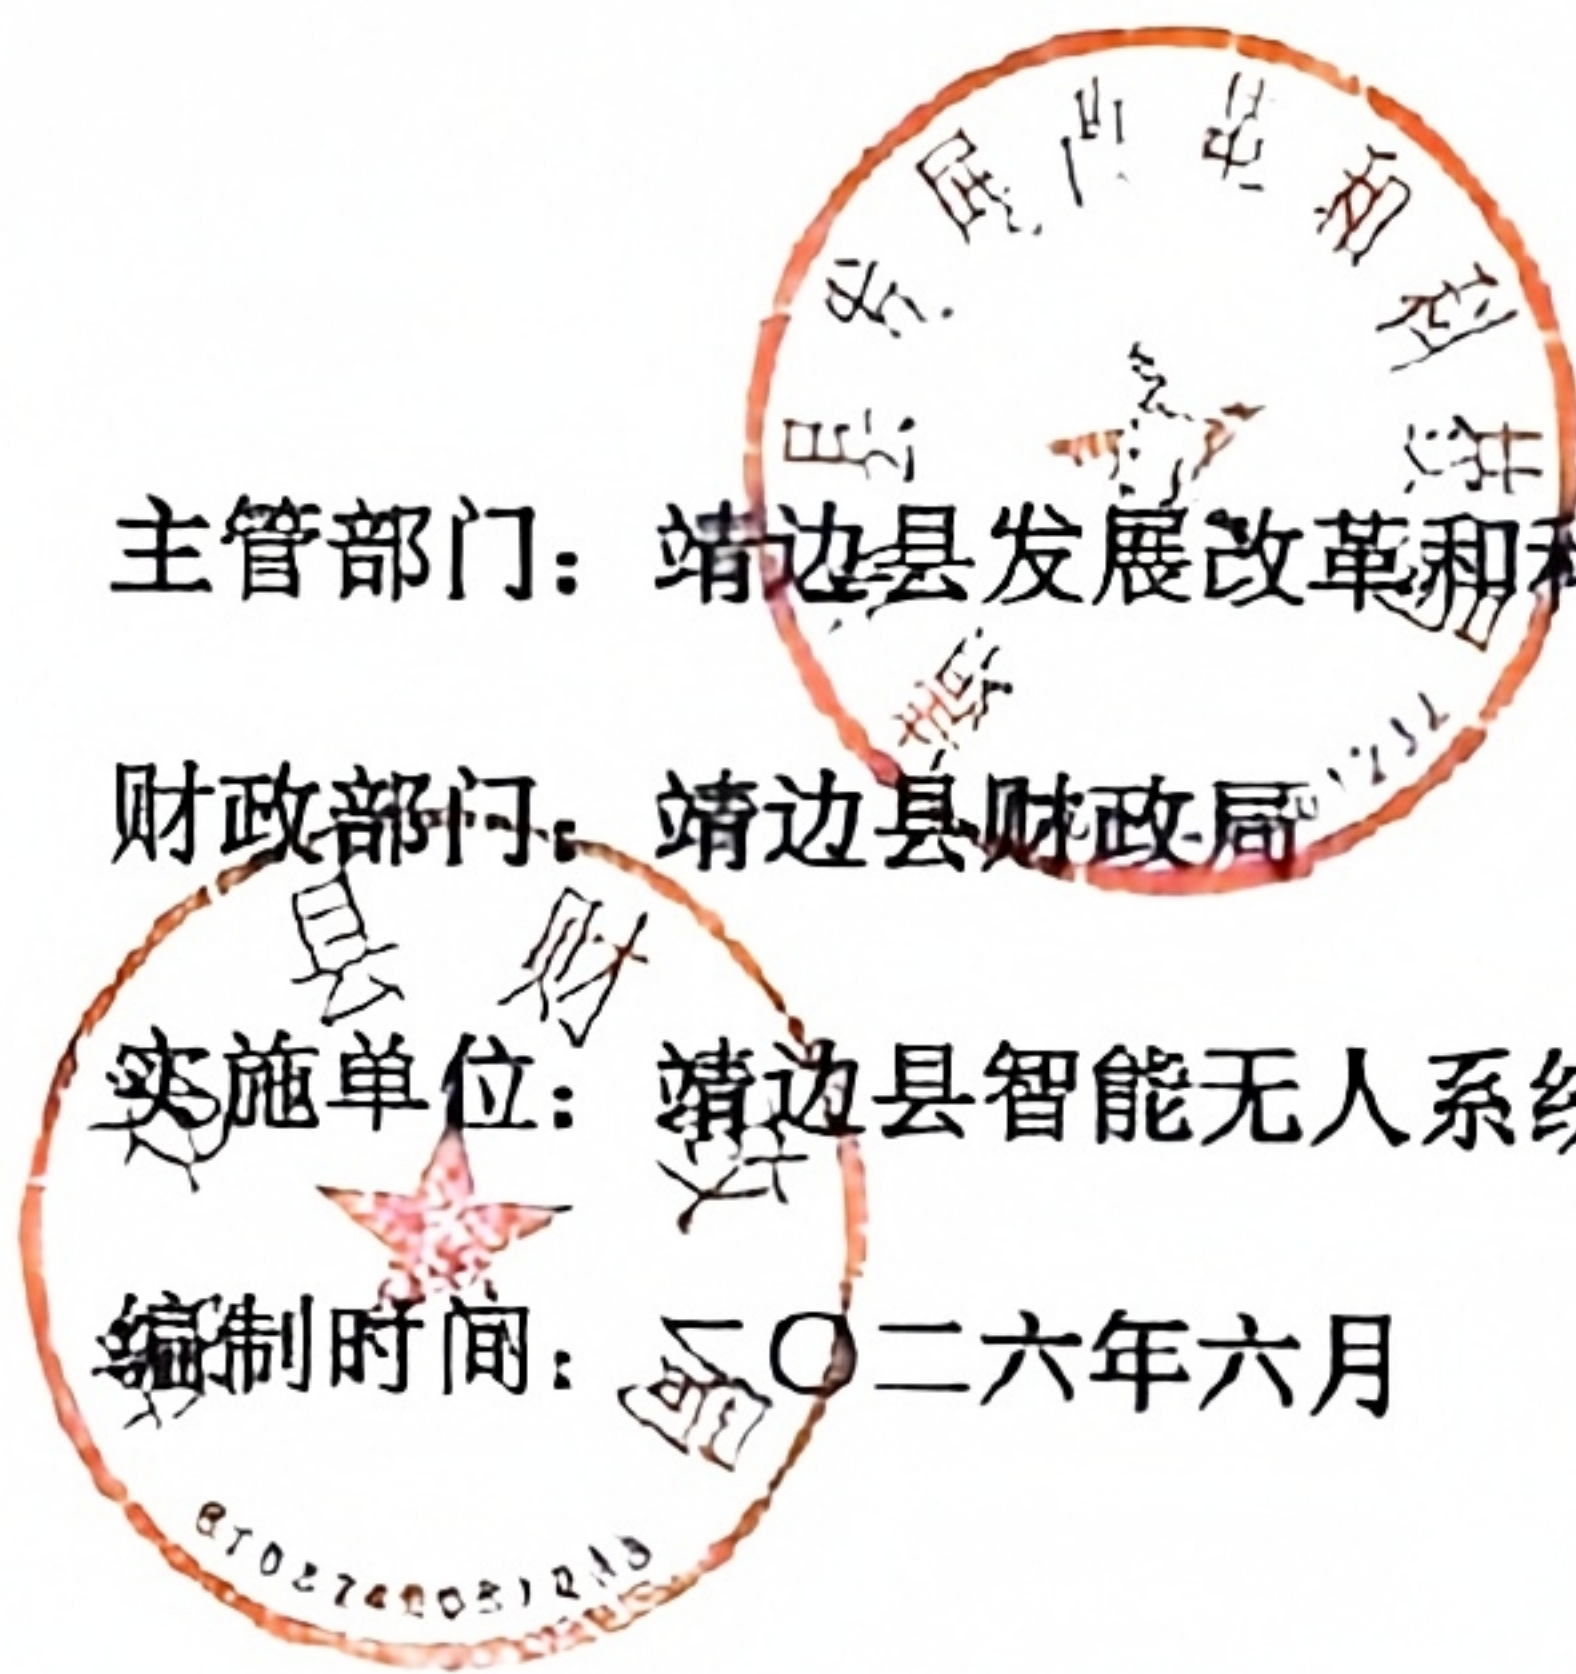

一、续发项目基本情况

靖边低空经济产业基地建设项目一期属于续发项目，已于 2025 年 10 月 23 日发行专项债券 4000.00 万元。

1、项目建设规模及内容

根据本项目初步设计及概算的批复，项目主要建设内容如下：

打造低空经济智能化数字化综合平台，项目总占地 80 亩，总建筑面积 15550 平方米，建设包括检验检测中心 1050 平方米、培训中心 1500 平方米、数据中心 1000 平方米、产业孵化基地 12000 平方米、30 米 x700 米的试飞通道、停机坪等低空经济服务平台，配套建设电力电信、给排水、燃气管网、消防等配套基础设施。

2、项目总投资

根据项目初步设计的批复，该项目概算总投资为 8660.00 万元，其中工程费为 7161.45 万元，建设其他费为 697.79 万元，基本预备费为 602.96 万元，建设期利息 197.80 万元。

3、资金筹措情况

本项目总投资 8660.00 万元，计划 2025 年发行政府专项债券 4000.00 万元，2026 年发行地方政府专项债券 300.00 万元，剩余资金来源为财政资金。

根据项目 2025 年债券发行实施方案、建设进度以及债券发行情况，本项目 2025 年 10 月已发行成功专项债券资金 4000.00 万元，按照已披露的专项债券实施方案，项目资金筹措表见表 1-1：

表 1-1 项目资金筹措表

单位：万元

序号	资金来源	合计	2025 年	2026 年	2027 年
1	专项债券	4300.00	4000.00	300.00	0.00
2	财政资金	4360.00	300.00	3600.00	460.00
3	合计	8660.00	4300.00	3900.00	460.00

本项目原方案计划 2025 年发行专项债券资金 4000.00 万元，2026 年发行专项债券资金 300.00 万元，项目作为靖边县重点推进项目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划 2026 年续发专项债券资金 300.00 万元用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。专项债券发行计划表见表 1-2：

表 1-2 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行月份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	10 月	4000.00	20 年期
2026 年	7 月	300.00	20 年期
合计		4300.00	/

二、续发项目进展情况

项目于 2025 年 8 月完成招标，中标金额为 6655.9665 万元，于 2025 年 9 月开工建设，在专项债券资金的有力支持下，项目建设顺利。

本项目截至 2026 年 5 月底，项目各单体框架主体结构已全部竣工。当前施工进展：1#楼顶层女儿墙、楼梯间脚手架搭设完成 25%；

2#楼一层构造柱、圈梁模板安装完毕，即将浇筑混凝土；钢结构主材分批次陆续进场。大型设备、水电管件相关合同均已签订完成，设备及管材待现场工序匹配后陆续进场、同步施工。

室外管网工程：雨水管线 Y46~Y53 区段沟槽开挖至换填基底累计施工 100 米，室外管网配套材料采购合同已签署，根据现场施工进度分批进场。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目已于 2025 年 10 月发行专项债券 4000.00 万元，截至目前，所有专项债券资金已全部使用，支付进度 100%。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。

